

西宁市湟中区教育局 关于 2022 年中央专项彩票公益金 实施情况的公示

为进一步提高彩票公益金管理过程公开、透明，广泛接受群众监督，根据资金管理要求，现将 2022 年中央专项彩票公益金项目情况公示如下：

一、资金使用及项目实施情况

根据《西宁市湟中区财政局关于下达 2022 年中央彩票公益金支持地方社会公益事业发展资金的通知》（湟财字〔2022〕131 号）的要求，下达我局 2022 年彩票公益金共计 2920 万元，截止目前，已完成支付 2288.05 万元，结转 631.95 万元。

1. 湟中区多巴清源学校建设项目

项目名称：湟中区多巴清源学校建设项目

建设内容：新建校舍 9460 平方米，配套设施建设，设备购置。

项目周期：项目于 2020 年 9 月开工建设，计划于 2023 年 8 月完工投入使用。

项目资金：对该项目下达中央专项彩票公益金 789 万。其中，二期 496 万元，三期 187 万元，四期 106 万元，共已完成支付 447.4 万，结转 341.6 万（三期项目结转），支出率为 56.7%。

项目完成情况：目前，一、二、四期建设项目已完工，正在准备竣工验收；三期建设项目主体施工。

2. 湟中区多巴第二高中建设项目

项目名称：湟中区多巴第二高中建设项目

建设内容：一期新建校舍 28420 平方米，配套设施建设，

设备购置。二期新建校舍 13596 平方米，配套设施建设，设备购置。

项目周期：项目于 2020 年 10 月开工建设，计划于 2024 年 9 月完工投入使用。

项目资金：对该项目下达中央专项彩票公益金 1731 万元。其中，一期 1115 万元，二期 616 万元，已完成支付 1715 万元，结转 16 万元（二期）。

项目完成情况：目前，一期项目一标段已完工，二标段正在装饰施工收尾阶段，二期项目正在装饰施工。

3. 湟中区土门关乡中心学校建设项目

项目名称：湟中区土门关乡中心学校建设项目

建设内容：坝沟教学点暖气地沟等，土门关初中外保温改造、课桌凳购置及运动场改造，加汝尔小学围墙、道路硬化等附属设施改造等。

项目周期：项目于 2022 年 10 月开工建设，计划于 2023 年 9 月完工投入使用。

项目资金：对该项目下达中央专项彩票公益金 400 万元，已支付 125.65 万元，资金支付率 31%。

项目完成情况：目前工程正在加紧施工阶段，已完成项目前期工程并支付前期费用。

二、预计完工效益

项目建设后将极大改善多巴地区教学资源紧缺的困境，增加优质学位，有效解决多巴地区学位供需矛盾。进一步优化教育资源，使城乡教育均衡发展，改善农村学校办学环境，提升基础办学条件，促进学校健康发展。


项目实施为当地群众解决了教学资源紧缺的困境，得到了当地群众的满意。同时通过项目实施，为师生提供了优质

的教学和学习环境，得到了全校师生的满意。


三、影像资料




图一：多巴镇清源学校附属设施建设

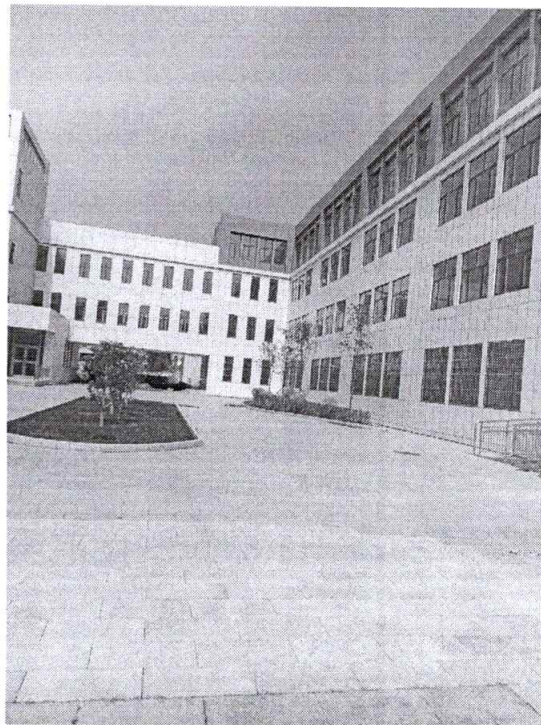

图二：多巴镇清源学校教学楼

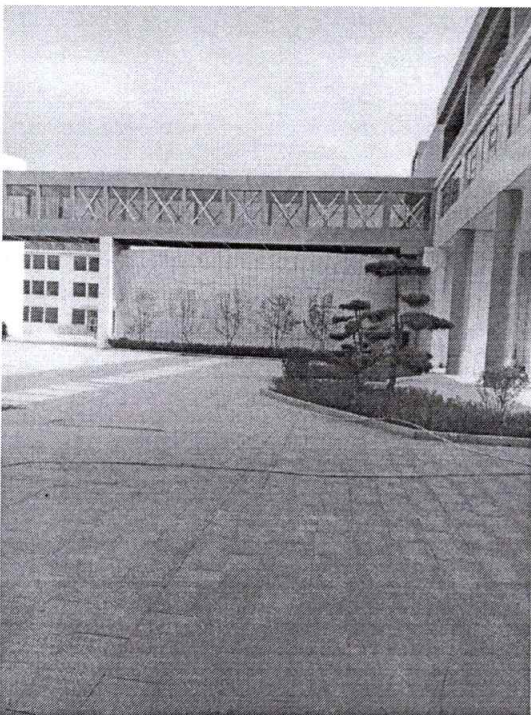


图三：湟中区多巴清源学校总图工程（硬化）

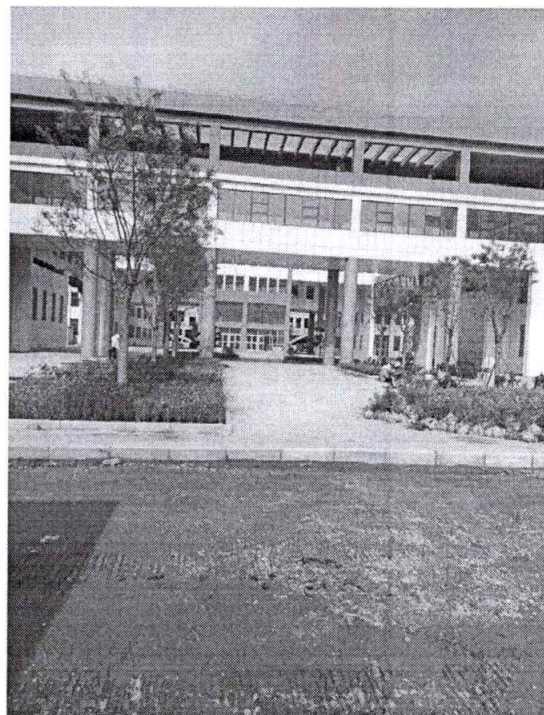


图四：湟中区多巴清源学校总图工（绿化）




图五：多巴第二高级中学一期建设项目 7#、8#楼

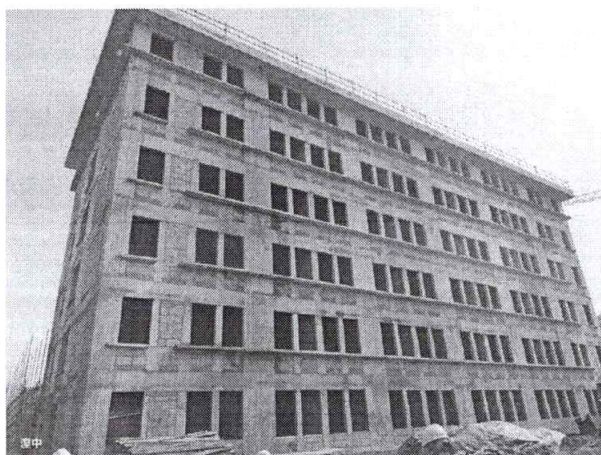

图六：多巴第二高级中学二期 2#宿舍楼

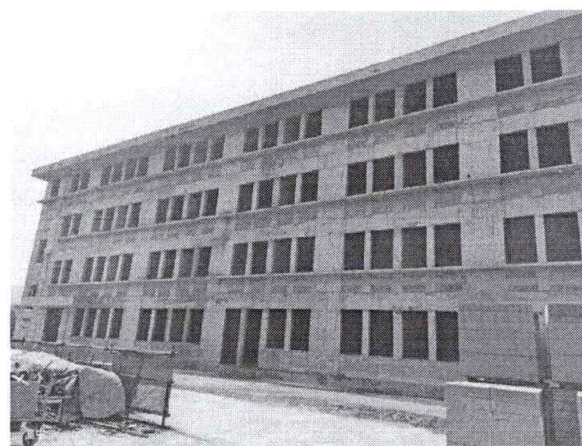

图七：多巴第二高级中学二期 3#宿舍楼

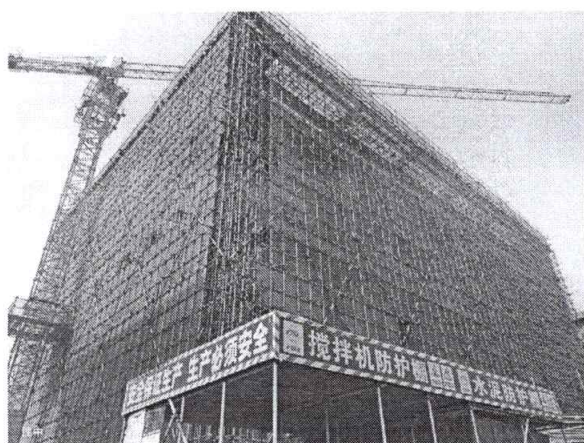

图八：多巴第二高级中学二期 9#综合楼



图九：土门关初中校舍外保温改造

四、项目和资金管理办法

湟中区教育局二级核算中心统一管理各项资金，严格按照《中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展资金管理办法》《青海省彩票公益金管理办法》要求执行。项目管理严格按照《湟中区教育系统基本建设项目管理办法》等相关法律法规执行。

五、项目绩效评价

湟中区教育局转移支付区域（项目）绩效目标自评表

（2022 年度）

转移支付（项目）名称	中央专项彩票公益金支持地方公益事业发展			
中央主管部门				
地方主管部门	湟中区财政局	资金使用单位		湟中区教育局
资金投入情况 (万元)		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	预算执行率 (B/A×100%)
	年度资金总额:	2920	2165.69	74.17%
	其中: 中央财政资金	2920	2165.69	74.17%
	地方资金			
	其他资金			
资金管理情况		情况说明		存在问题和改进措施
	分配科学性	根据湟中教育“十四五”规划安排，主要用于多巴清源学校一、二、三、四期建设项目，多巴第二高级中学一、二期建设项目和土门关中心学校建设项目。将资金落实到实处，极大改善土门关地区学校办学条件，惠及多巴地区及周边8个乡镇约20万人口，为多巴地区增加优质学位约6000个，很大程度上解决了多巴地区学龄人口增加与学校学位紧张的供需矛盾，进一步满足了人民群众对优质教育资源的需求。		
	下达及时性	根据《西宁市湟中区财政局关于下达2022年中央彩票公益金支持地方社会公益事业发展资金的通知》（湟财字〔2022〕131号）要求，2022		

资金管理情况			年6月1日下达我局2022年彩票公益金2920万元。			
		拨付合规性	严格按财务相关法律法规、国库集中支付制度执行。			
		使用规范性	严格按照相关财经法律法规执行。			
		执行准确性	严格按照相关财经法律法规执行。			
		预算绩效管理情况	严格按照项目绩效管理制度执行。			
		支出责任履行情况	教育局作为资金使用责任单位，严格按照相关财务制度执行。			
总体目标完成情况	总体目标		全年实际完成情况			
	改善土门关地区学校办学条件，惠及多巴地区及周边8个乡镇约20万人口，为多巴地区增加优质学位约6000个，解决多巴地区学龄人口增加与学校学位紧张的供需矛盾，进一步满足了人民群众对优质教育资源的需求。		多巴清远学校建设项目一、二、四期建设项目已完工，三期建设项目主体施工，计划2023年8月完工。 多巴第二高级中学建设项目一期项目完成装饰施工，二期项目正在主体施工。 土门关中心学校建设项目正在组织施工，预计2023年8月完工。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	支持义务教育建设项目数量	≥3	≥3	
			“两个责任”按项目落实到位率	≥100%	≥100%	
			维修改造项目面积	≥1000平方米	≥1000平方米	
		质量指标	项目编制完整性、合规性	≥100%	≥100%	
			年度内完成工程量合格率	≥100%	≥100%	
			项目开展符合当地实际情况并实行重点倾斜	≥100%	≥100%	
	时效指标	年度内工作任务及时完成率	≥70%	≥50%	2022年由于受疫情影响，工程进度较慢，资金支付率偏离预期绩效目标。下一步，我局将根据目前项目资金使用情况，积极与财政部门协商沟通，解决预算执行中存在的突出问题，加快资金支付进度，确保完成2022年彩票公益金项目预期目标。	
		按时上报资金使用情况	≥100%	≥100%		

	产出指标	时效指标	资金在规定时间内下达	≥100%	≥74.17%	2022年由于受疫情影响，工程进度较慢，资金支付率偏离预期绩效目标。下一步，我局将根据目前项目资金使用情况，积极与财政部门协商沟通，解决预算执行中存在的突出问题，加快资金支付进度，确保完成2022年彩票公益金项目预期目标。
	效益指标	社会效益指标	提升学校办学基础条件，促进学校健康发展	定性	持续提高	
			改善教育教学环境提升办学条件	定性	效果明显	
			提供优质学位，有效解决供需矛盾	定性	效果明显	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥98%	≥98%	
学校教师满意度			≥98%	≥98%		
说明	无					

2022年彩票公益金项目开展绩效自评，评价结果：良。下一步，我局将根据目前项目资金使用情况，积极与财政部门协商沟通，解决预算执行中存在的突出问题，制定相关政策措施，加快资金支付进度，确保完成2022年彩票公益金项目预期目标。

西宁市湟中区教育局
2023年5月23日

